

# ■ 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊

## 1 危害性化學品暴露危害評估


### 說明

無鉛焊錫線沒有正確的 GHS 危害性化學品標示。



### 改善措施

已重新標示符合相對應之危害標示。

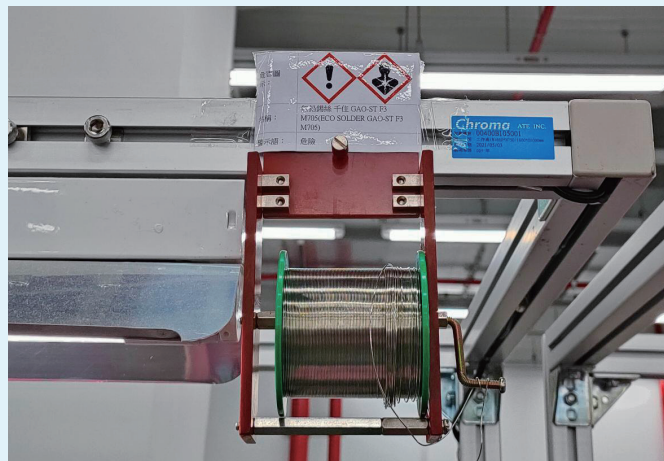

## 2 危害性化學品暴露危害評估

### 說明

化學品 (催化劑) 容器並未有張貼 GHS 圖示。



### 改善措施

催化劑容器瓶身應要有張貼 GHS 圖示。




### 3 危害性化學品暴露危害評估

#### 說明

現場未設置化學品 SDS & GHS

#### 改善措施

使用現場立即備置適性 SDS & GHS

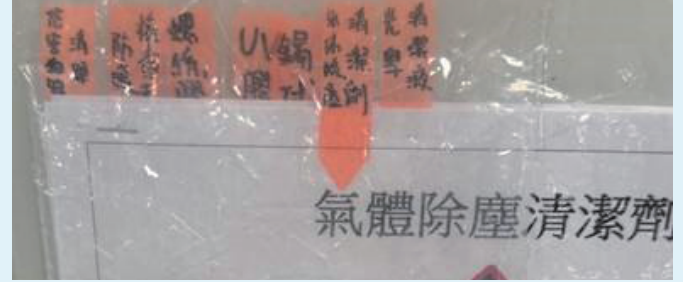

### 4 滅火器受阻礙

#### 說明

滅火器前方堆放雜物



#### 改善措施

已將雜物清理完畢



### 5 自動檢查

#### 說明

個人防護用品檢查表未更新


#### 改善措施

重新確認並檢點




## 說明

局部排氣設備未設置檢點表

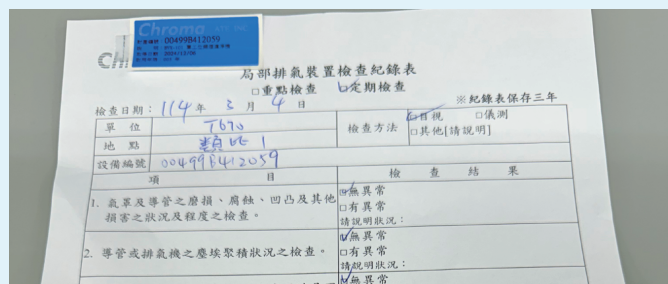

## 改善措施

已立即重新建置並檢點

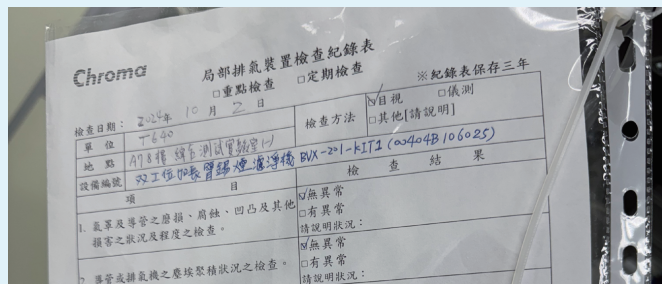


## 說明

發現輸送帶末端縫隙過大，人員拿取物料時，恐有手指遭輪軸捲入之危害。



## 改善措施

於輸送帶縫隙處加裝蓋板，防止人員手指不慎插進縫隙遭輪軸捲入。

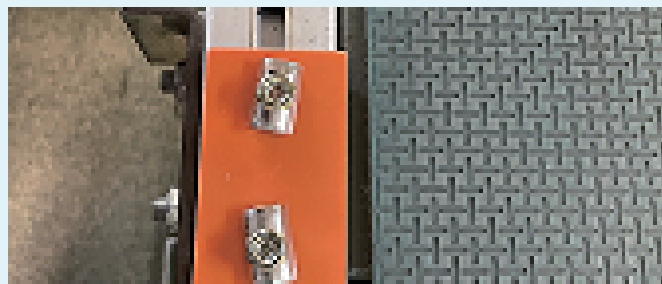

## 說明

配電盤前阻擋未淨空



## 改善措施

清空阻礙物，以免發生危險

